

Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
2651 Rétság, Rákóczi út 20
Balogh Péter ügyvezető

Rétság Város Önkormányzat
2651 Rétság, Rákóczi út 20
Mezőfi Zoltán polgármester

Tárgy : Tájékoztatás a TIOP-2.1.2 „Kistérségi járóbeteg –szakellátó központok kialakítása és fejlesztése” pályázat keretein belül, a rendelő épület megvalósításának helyzetéről

Tisztelt Polgármester Úr !

Felkérésére, a tárggyal kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adom:

A megvalósítás jelenlegi állapota az előző testületi ülésre készített előterjesztésünk óta eltelt időszakra vonatkozóan:

- Az épület kivitelezési munkái az ütemezésnek megfelelően haladnak, az 70 %-os készütségig a teljesítésigazolások kiadhatóak voltak, a jelenlegi készütség megközelíti a 85 % - ot az alábbiak szerint:
- Az épületben az épületgépészeti és elektromos alapszerelések befejeződtek és nagy értékű központi gépészeti berendezések is leszállításra kerültek. A lépéshangszigetelt aljzatok burkolás előtti állapotba kerültek , a belső vakolás elkészült. Az épületben a fal és padlóburkolások hamarosan elkezdődnek , a festési munkák folyamatban vannak, gipszkartonozások folyamatban vannak
- A homlokzati hőszigetelés folyamatosan halad, a homlokzat színezése elkezdődött
- A külső közmű alépítményi munkálatok befejeződtek, az út és járdaépítések befejezés előtt állnak
- Az elektromos nagyfeszültségű külső betápláló kábel lefektetésre került

- A nagyértékű röntgen, ultrahang berendezések közbeszerzése lezárult, az un. egyéb orvosi eszközök beszerzési eljárását jogorvoslat miatt nem lehetett lezárni. A bútorbeszerzés, az informatikai rendszer és medikai szoftver közbeszerzései május végétől folyamatosan indulnak


A humán erőforrás szervezését a korábbi tájékoztatásunknak megfelelően megkezdtük , a szakszemélyzet toborzásával a Human Sales Személyzeti Tanácsadó Kft.-t bíztuk meg, a vezető állások betöltésére a jogszabályok szerinti pályázatokat írunk ki

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Nonprofit Kft. Taggyűlése a 2009.évi egyszerűsített mérlegbeszámolót a mai napon elfogadta.

Melléklet: 2010.05.20-i építéshelyszíni fotók

Rétság, 2010. május 20


Rétsági kistérségi
Egészségfejlesztő Központ
Nonprofit Kft.
2651 Rétság, Rákóczi u. 20
Adószám: 14459191-2-12
Balogh Péter
ügyvezető igazgató

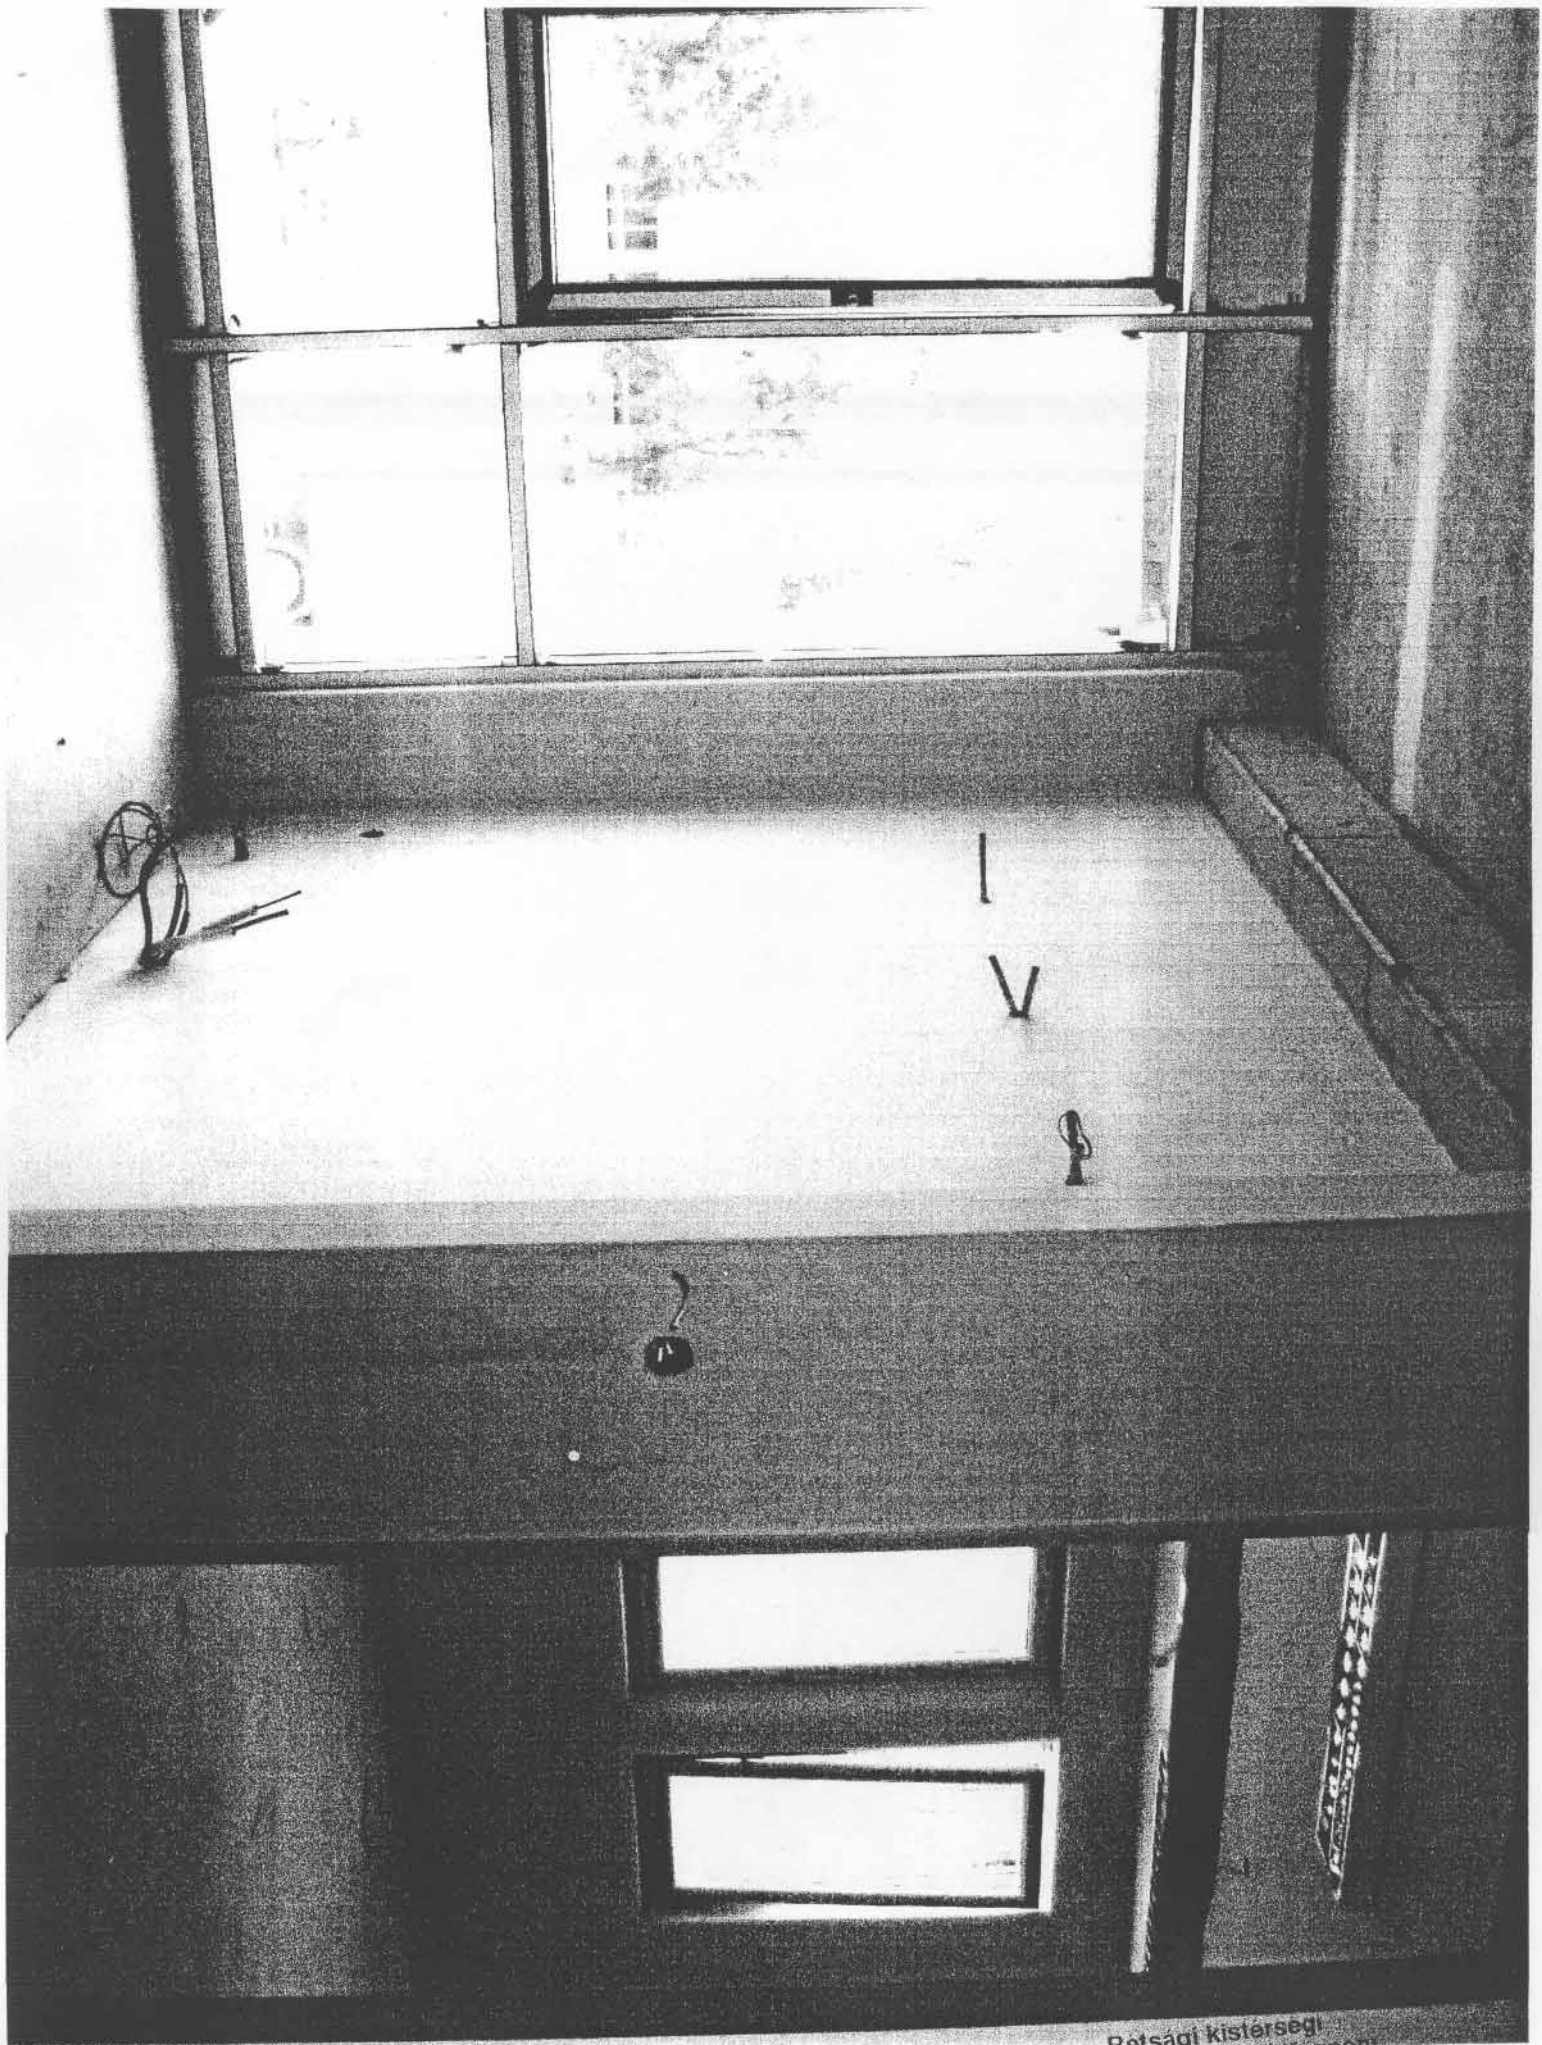

2010.05.20.


Emeleti irod.

Retsági kistérségi
Egészségfejlesztő Központ
Nonprofit Kft.
2651 Retság, Rákóczi u. 20
Telefon: 14459191-2-12

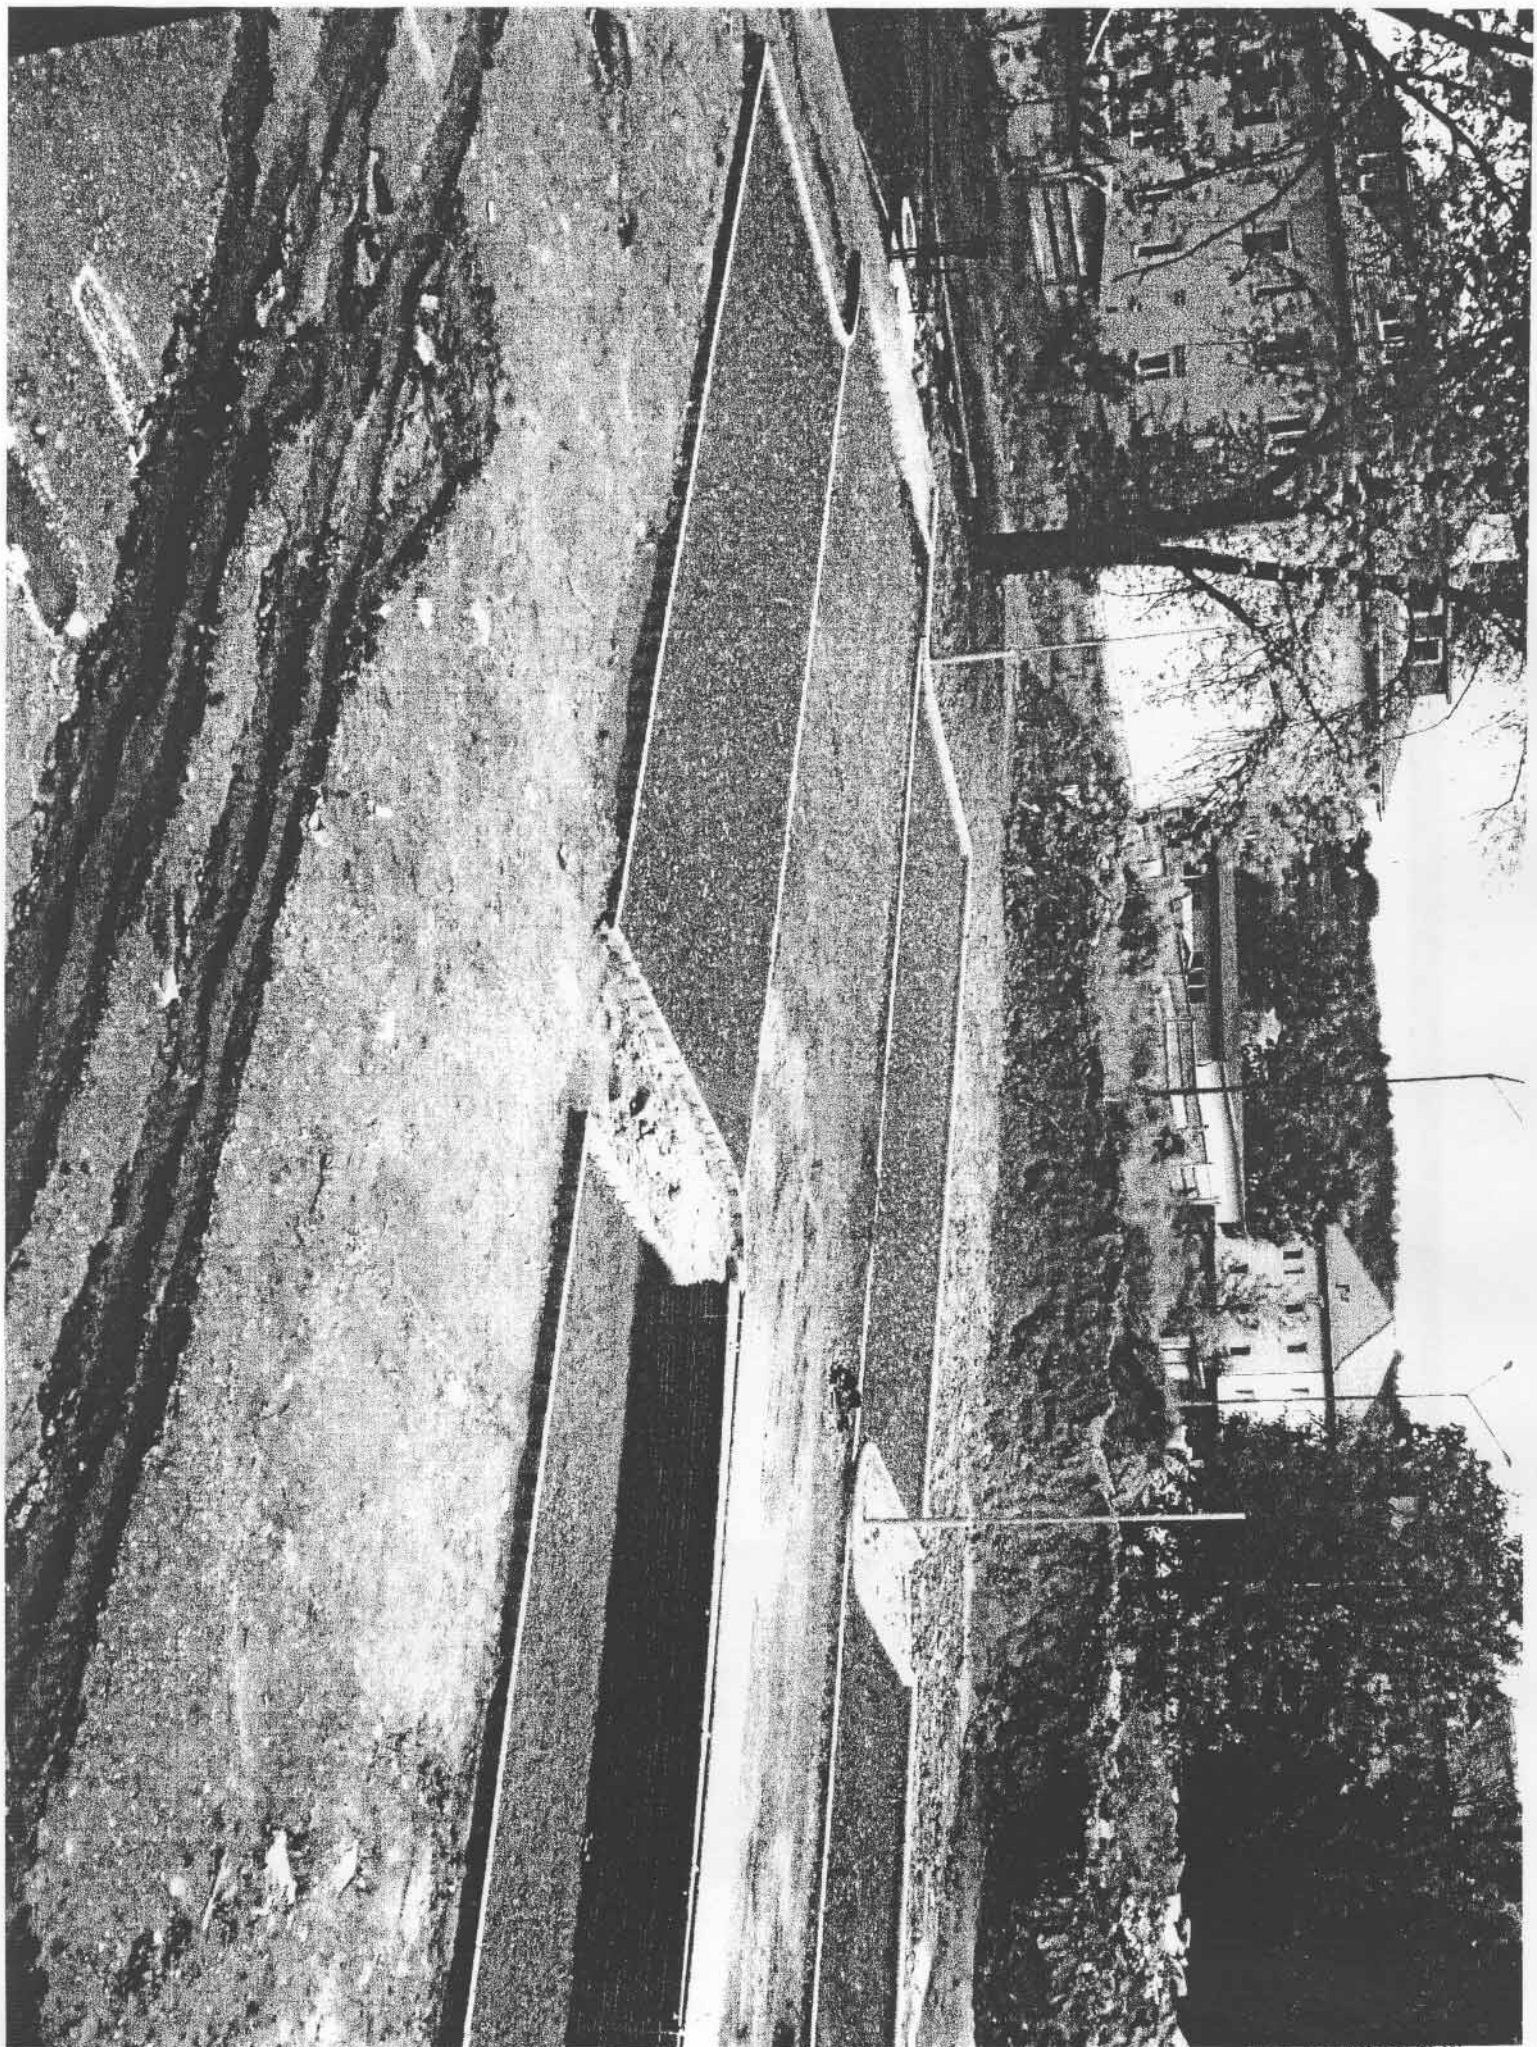


2010. 5. 20. Útépítés, aszfaltrendezés

Retsági Kistérség
Egészségfejlesztő Központ
Nonprofit Kft.
2651 Retság, Rákóczi u. 20
2010. 05. 20.

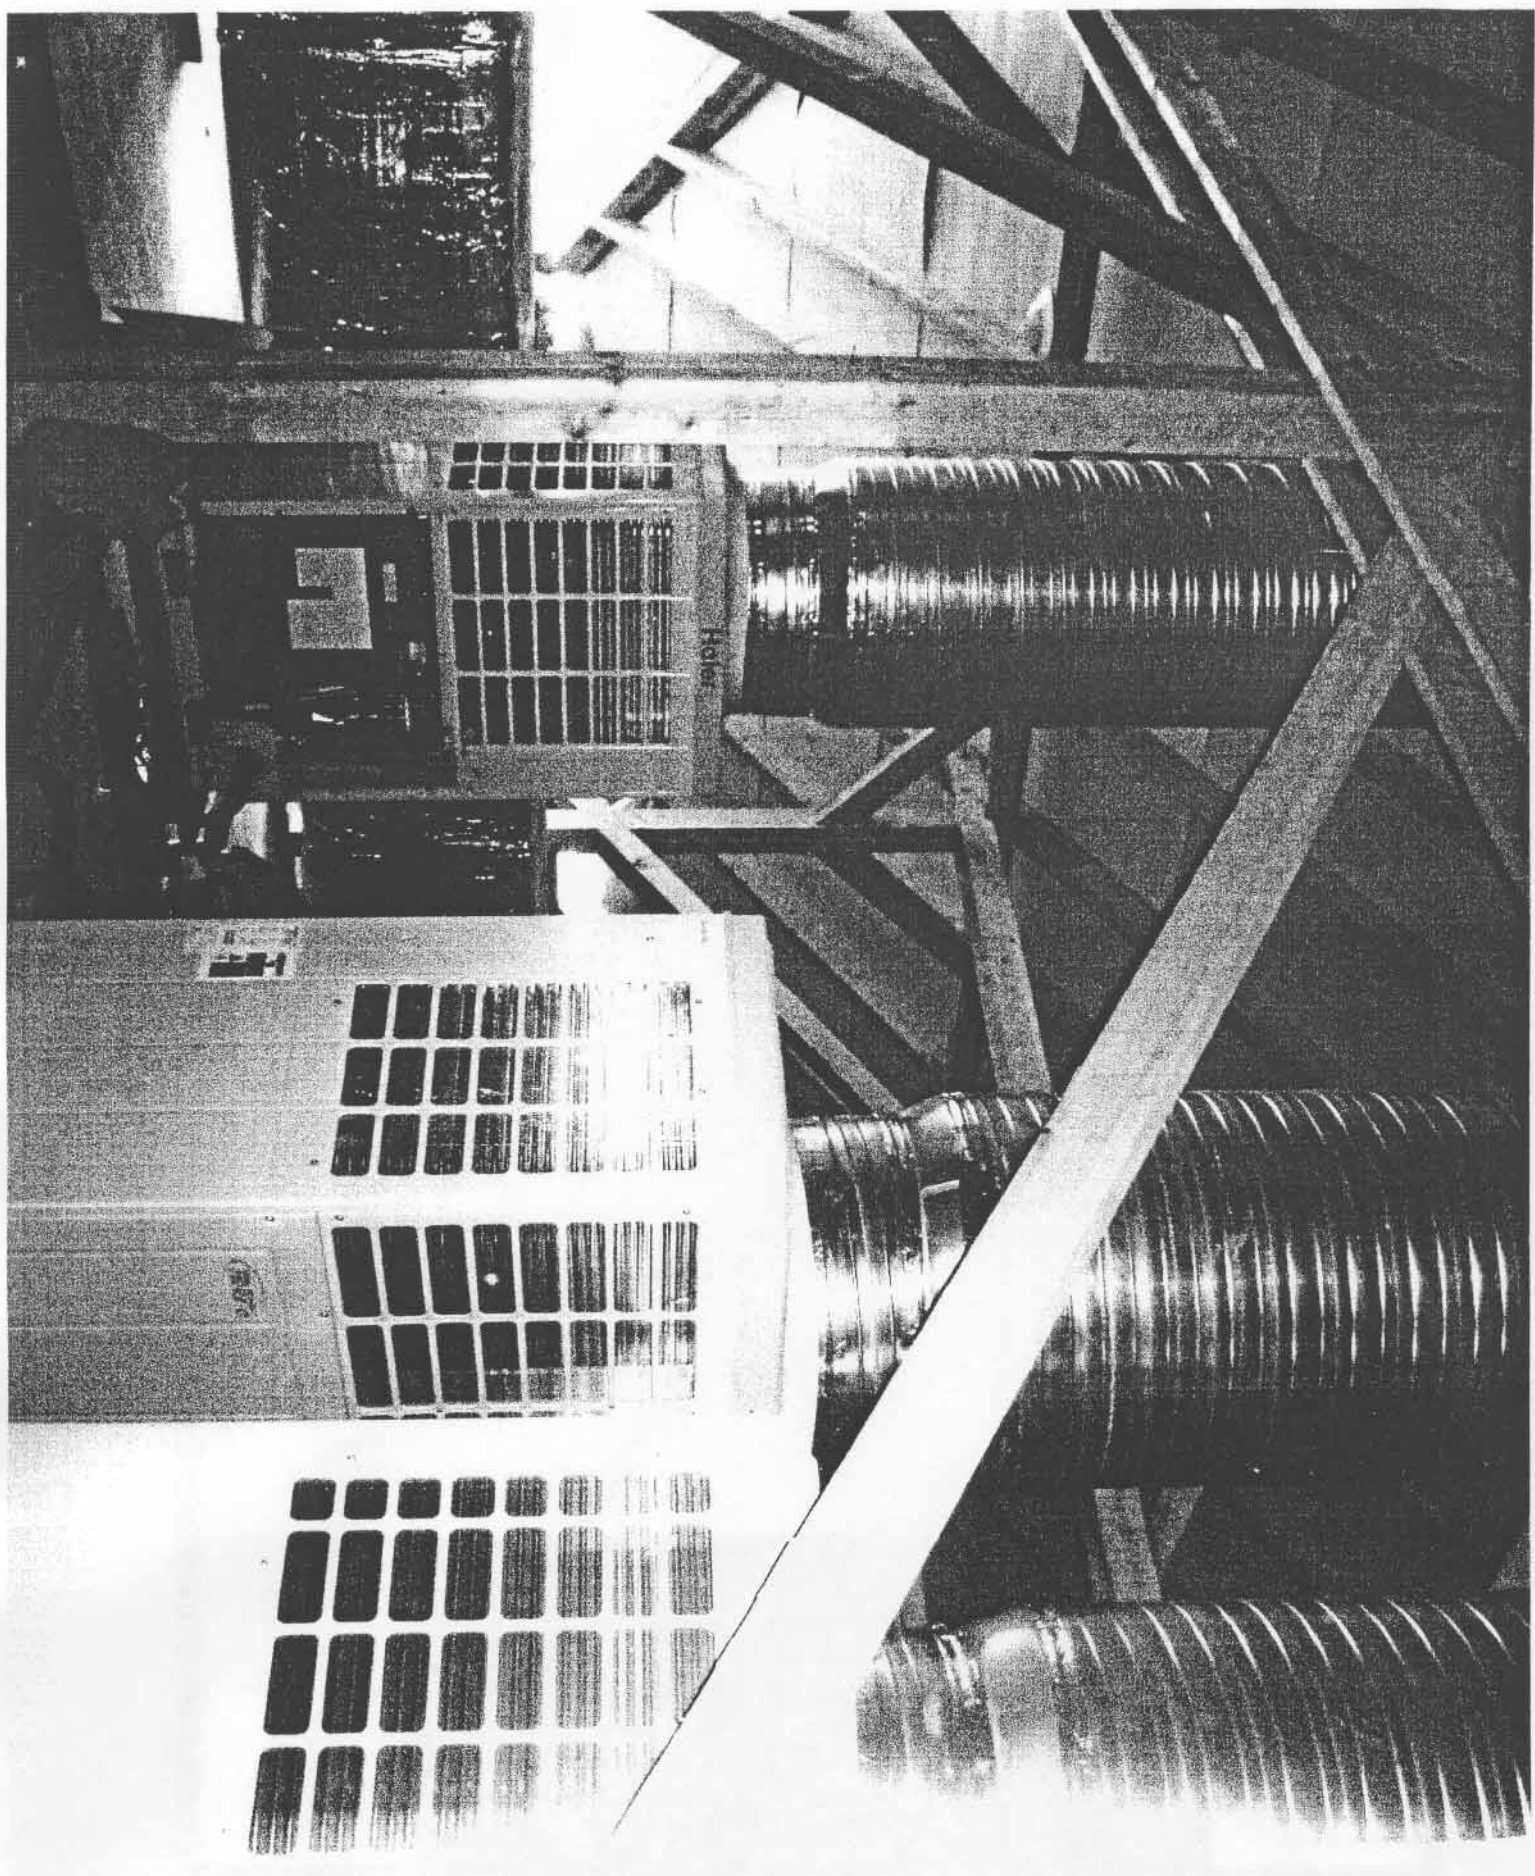

*2010. évi
Tervezési költségvetés*


Rétsági kistérség,
Egészségfejlesztő Központ,
Nonprofit Kft.
2651 Rétság, Rákóczi u. 20
Adószám: 14459191-2-11

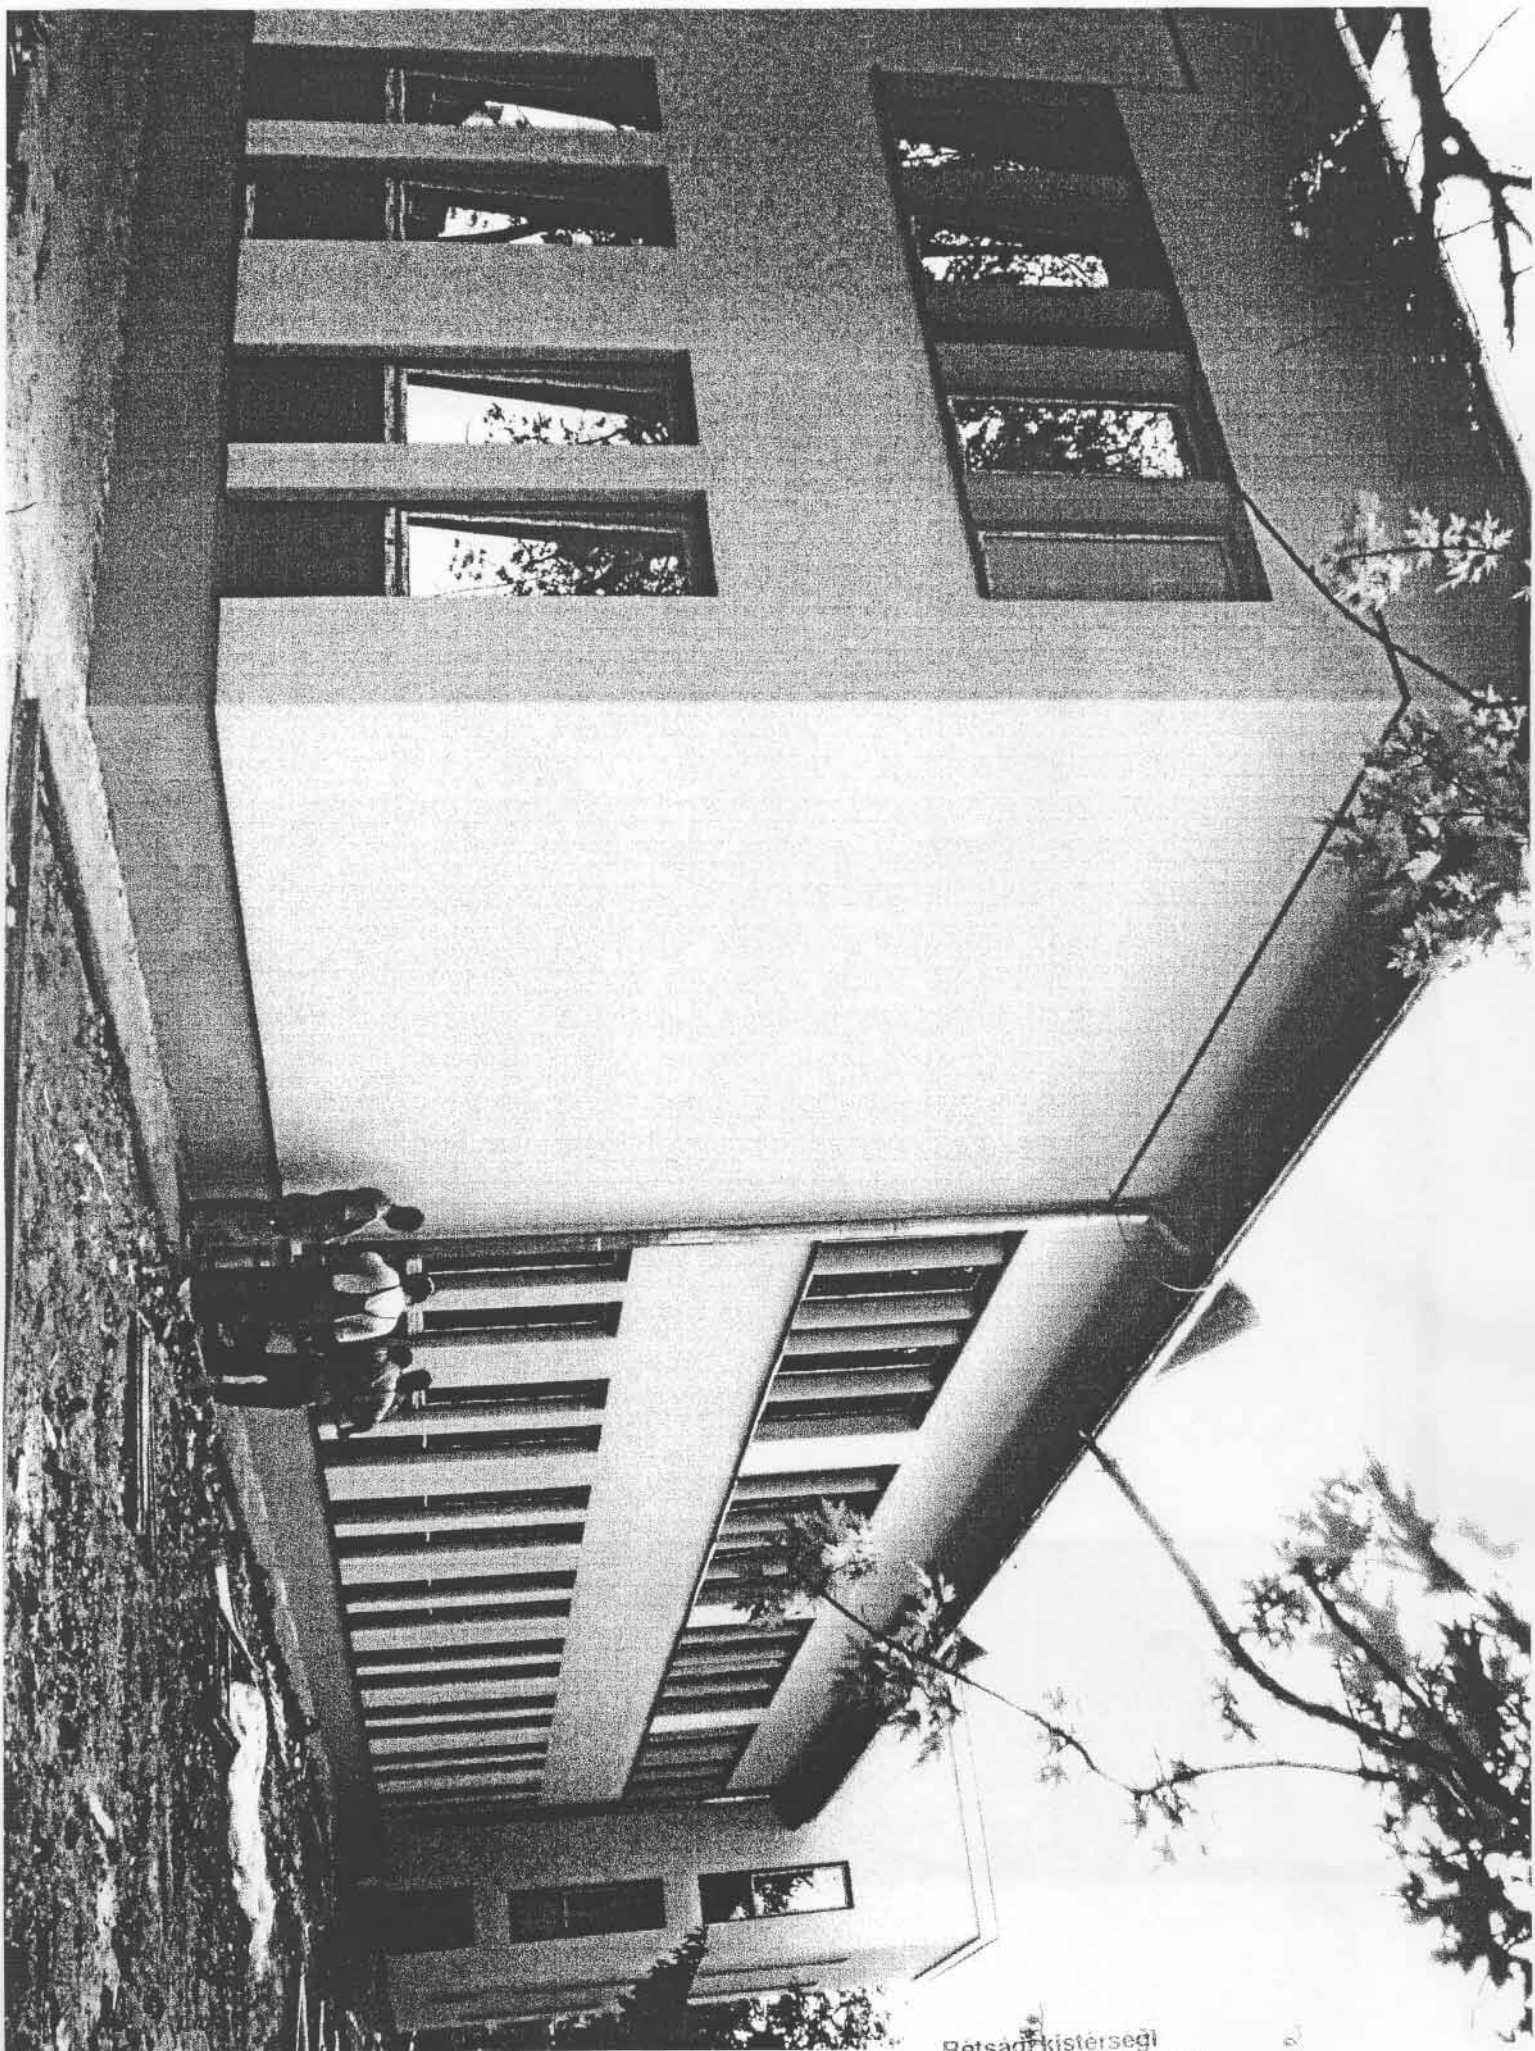

2010. 06. 20.

45m/16.201

Rétság-kistérségi
Egészségfejlesztő Központ
Nonprofit Kft.
2651 Rétság, Rákóczi u. 20.

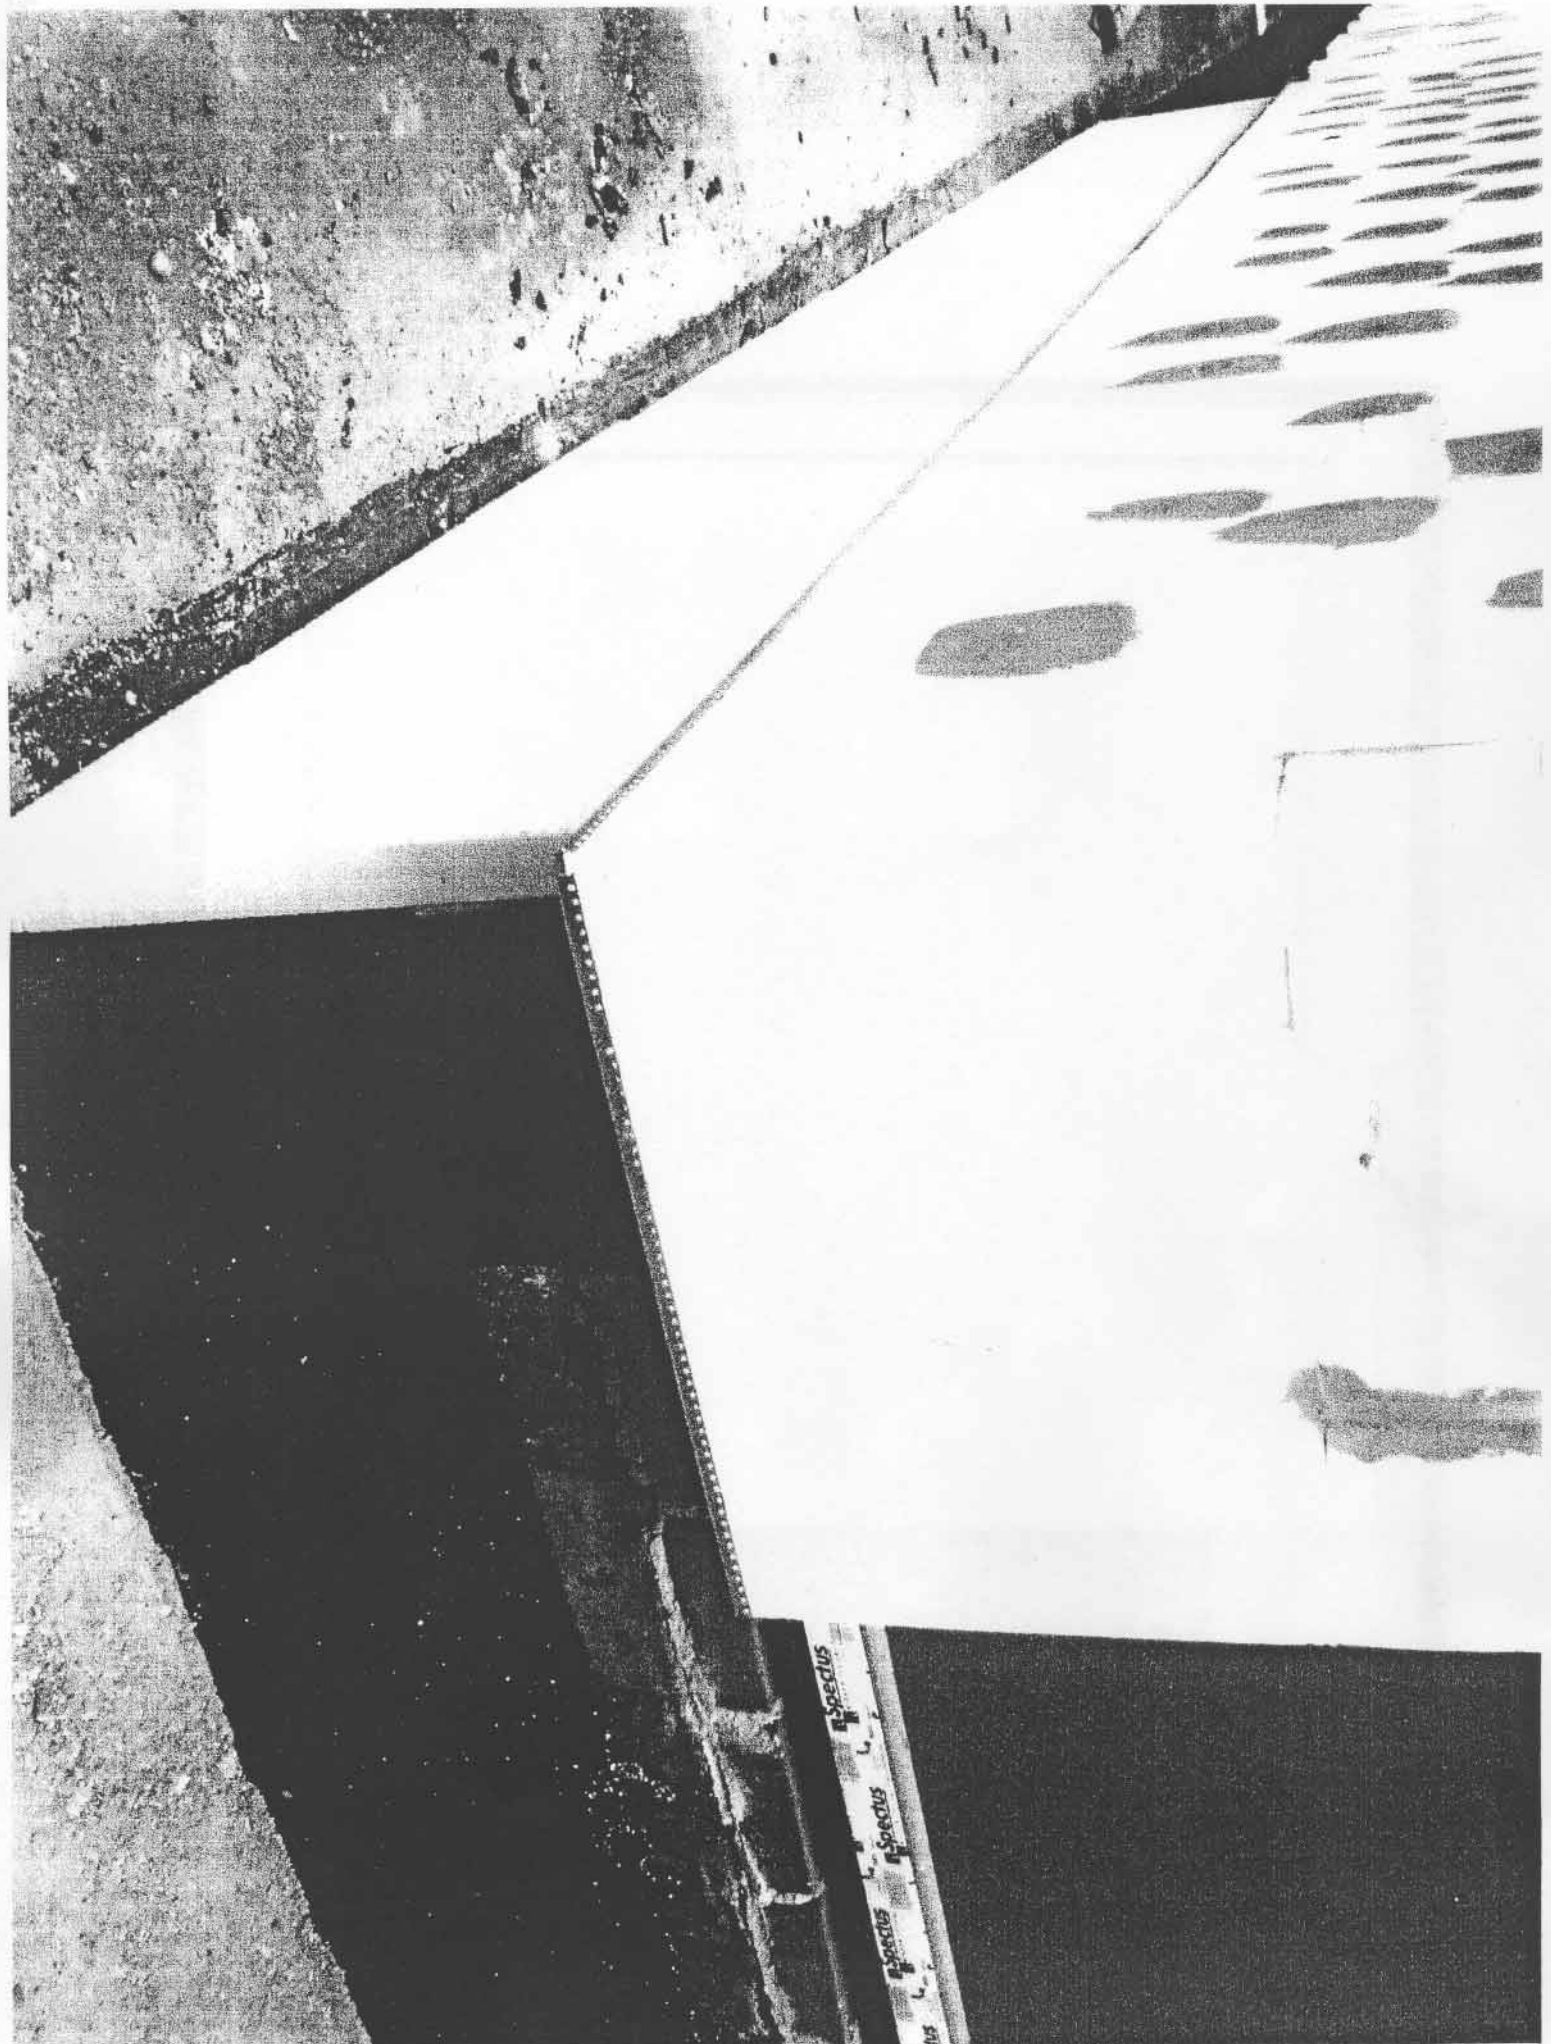

Hemlektől rögzítés

Retsagi kistérségi
Egészségfejlesztő Központ
Nonprofit Kft.
Működési u. 20
